

数飞科技(宁波)有限公司

运维服务发布管理制度

文档编号	SFKJ-ITSS-0607	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

1. 目的	5
2. 过程定义	5
2.1. 范围	5
2.2. 过程负责人	5
2.3. 主要输入	6
2.4. 主要输出	6
2.5. 角色和职责权限	6
2.5.1. 运维部经理（发布管理负责人）	6
2.5.2. 发布负责人	7
2.5.3. 发布测试人员	7
2.5.4. 质量部	7
2.6. 过程重要控制点	8
3. 术语	8
4. 流程	8
5. 过程描述	9
5.1. 制定发布方案	9
5.2. 发布方案评审	9
5.3. 制定回退计划	9
5.4. 发布确认	10
5.5. 部署前备份	10
5.6. 部署	10
5.7. 验证	10
5.8. 发布关闭	10
5.9. 发布报告	11
6. KPI指标	11
7. 相关记录	11
8. 输出的文件和记录	11

表目录

表 2-1 发布输入清单6

表 2-2 发布输出清单6

表 2-3 发布人员岗位表7

表 2-4 发布测试人员岗位表7

表 5-1 评审人员组成表9

表 6-1 KPI指标表11

表 8-1 输出文件和记录表11

图目录

图 4-1 发布管理流程图8

1. 目的

本制度旨在对数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“公司”）发布过程制定规范。发布是由一项或多项经过批准的变更所组成。发布管理定义了软件和相关硬件的过程规范，并负责将经过测试无误的软硬件版本发布到目的变更地点。

2. 过程定义

发布管理是采用一种项目规划的方法来实现服务过程中的变更，负责处理变更项目所有技术和非技术方面的问题。

在现实的服务模式中，一般变更都会在复杂、相互关联的环境中产生变化，因此，配置项的发布和实施需要进行慎重的规划。一项发布是一组新的或变更后的配置项，经过测试后被导入实际运营环境的过程。

2.1. 范围

本制度适用于公司运维部、研发部、质量部及其他参与运维服务的相关部门。

发布管理涉及的范围包括：

1. 发布政策制定和发布规划
2. 发布设计、构建和配置
3. 测试和发布验收
4. 试运行规划
5. 沟通、准备和培训
6. 发布分发和安装

不包括：

1. 公司其他项目及业务领域的发布

2.2. 过程负责人

发布管理负责人：运维部经理

2.3. 主要输入

表 2-1 发布输入清单

输入	来源
发布通知	变更管理
经过测试和验证的软硬件配置项	变更管理
变更审批结果	管理层

2.4. 主要输出

表 2-2 发布输出清单

输出	去向
发布方案	本次发布的影响范围及涉及的相关部门
测试验收报告	发布管理负责人及相关责任人
上线计划	发布管理负责人、相关责任人及涉及的公司相关部门
回退计划	发布管理负责人、发布实施人员
发布后的评审记录	发布管理负责人

2.5. 角色和职责权限

2.5.1. 运维部经理（发布管理负责人）

- 1. 总体上管理和监控过程，建立发布过程实施、评估和持续优化机制；
- 2. 负责本制度的制订、修正与管理；
- 3. 定义并维护发布管理流程文件及所需要的记录模板；
- 4. 管理发布管理流程的实施；
- 5. 确保发布管理流程目标的实现；
- 6. 识别发布管理过程中存在的问题并提出改进措施；
- 7. 负责发布方案的审批。

2.5.2. 发布负责人

发布负责人由以下岗位根据发布内容承担：

表 2-3 发布人员岗位表

岗位名称	所属部门	适用场景
硬件运维工程师	运维部	硬件类发布的实施与协调
软件运维工程师	运维部	软件类发布的实施与协调
研发工程师	研发部	自研工具或系统的发布协调

发布负责人职责：

1. 负责发布方案的落实；
2. 负责发布计划的安排，以及在发布过程与用户的沟通协调工作；
3. 负责整个发布过程的跟踪，直到关闭；
4. 确保发布前的测试是可靠、稳定的；
5. 协助发布管理负责人不断完善发布管理流程。

2.5.3. 发布测试人员

发布测试工作由以下岗位承担：

表 2-4 发布测试人员岗位表

岗位名称	所属部门	职责
测试工程师	研发部	根据发布方案和计划进行内容测试，提交测试报告
硬件运维工程师	运维部	参与硬件类发布的测试验证
软件运维工程师	运维部	参与软件类发布的测试验证

发布测试人员职责：

1. 根据发布方案和计划进行内容的测试；
2. 提交测试报告。

2.5.4. 质量部

1. 确保发布过程实用、有效、正确地执行；

2. 当过程不能够适应公司的情况时，及时进行分析、找出缺陷、进行改进，实现可持续提高过程效率。

2.6. 过程重要控制点

发布方案、回退计划。

3. 术语

发布：发布管理是采用一种项目规划的方法来实现服务环境中的变更，负责处理变更项目所有技术和非技术方面的问题。


变更：变更是指在维护过程中对系统或服务所作出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。

发布方案：用于规范发布过程中实施内容的控制文档。

4. 流程

发布管理总体流程如图4-1所示

图 4-1 发布管理流程图

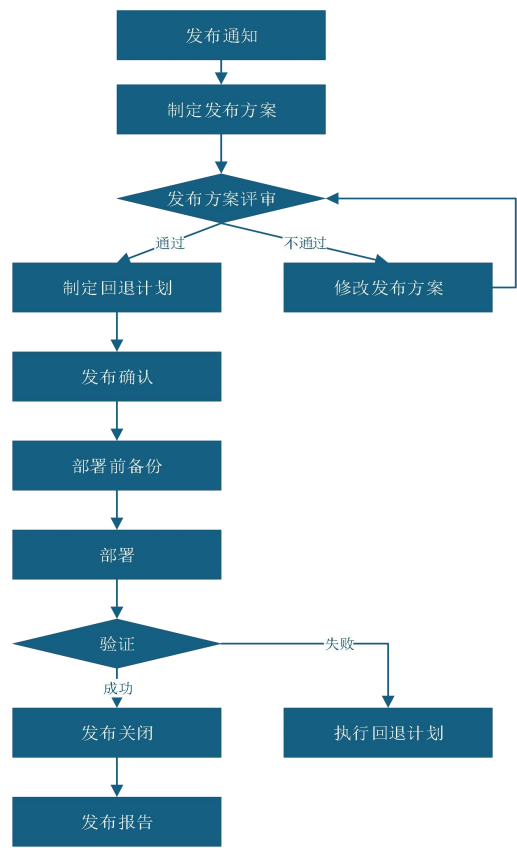

5. 过程描述

5.1. 制定发布方案

发布管理负责人根据变更计划制定《发布方案》。发布方案一般包括：

1. 描述发布的目的和背景；
2. 描述发布影响范围；
3. 确定参与部门及人员；
4. 对会员和服务支持人员的交流、准备、备案和培训；
5. 确定测试、培训、客服支持、现场部署等工作计划，包含上线规划；
6. 安排部署完成的后续工作计划；
7. 确定在发布失败情况下的回退方案；
8. 可预见问题以及相应的解决方法；
9. 确定与软、硬件有关的配置基线。

5.2. 发布方案评审

由发布管理负责人牵头，各发布干系部门负责人参与评审发布方案，评审通过后实施。评审参与人员包括如表5-1所示

表 5-1 评审人员组成表

角色	岗位	职责
发布管理负责人	运维部经理	主持评审，介绍发布方案
发布负责人	硬件/软件运维工程师或研发工程师	说明发布技术细节
评审成员	研发部经理	评估技术方案可行性
评审成员	质量部经理	评估对服务质量的影响
评审成员（必要时）	客户代表	评估对客户业务的影响

5.3. 制定回退计划

发布负责人应制定发布与部署的回退计划，一旦部署发生异常或失败，则启动回退。

发布方案、回退计划及测试报告提交发布管理负责人。

5.4. 发布确认

发布负责人接到发布管理负责人审批的发布申请后，根据发布信息构建发布方案，包括详尽的发布计划、具体操作步骤等。

发布负责人组织相关人员按照发布方案构建测试环境，组织相关人员进行发布与部署测试，以验证发布方案和部署包的正确性。

经过验证后，发布负责人应识别本次发布影响和涉及的相关方，并于部署实施前，通知相关方以确定发布时间。

5.5. 部署前备份

发布管理负责人组织相关专家对发布方案、回退计划和测试报告进行确认，通过后进入部署环节。

所有的发布应在部署完成后关联发起配置信息更新确认，如本次发布涉及配置项及其信息的变化，则应对配置信息进行更新。

5.6. 部署

发布管理负责人安排发布实施人员按照发布方案执行部署，部署前应对程序和数据进行备份。

5.7. 验证

发布管理负责人验证发布是否成功。如果成功，则发布完成后关闭；如果不成功，则按计划执行回退，直到发布成功。

5.8. 发布关闭

所有的发布应在部署完成后进行评审，在一定时间段内观察部署后IT服务的运行状态，直至确认运行稳定。发布实施人员整理发布资料，对资料归档，关闭发布。

5.9. 发布报告

发布完成后，收集如下的信息：

- 1. 发布引起的事件或问题数量
- 2. 发布的数量

对发布数据进行分析，找出存在的问题，并提出纠正或预防措施，编写出《发布报告》，成为服务报告的一部分。

6. KPI指标

表 6-1 KPI指标表

指标名称	指标计算方式	目标值	考核频次
发布成功率	(发布成功次数 / 发布总次数) ×100%	≥95%	季度

7. 相关记录

- 1. 《事件管理程序》
- 2. 《问题管理程序》
- 3. 《发布管理程序》
- 4. 《配置管理程序》
- 5. 《服务级别管理程序》
- 6. 《信息安全管理程序》

8. 输出的文件和记录

表 8-1 输出文件和记录表

文件和记录	责任部门
《发布方案》	运维部
《测试验收报告》	研发部
《上线计划》	运维部
《回退计划》	运维部

文件和记录	责任部门
《发布报告》	运维部
